Nome attività	Durata
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	7 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	7 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	7 g
Montaggio e smontaggio della gru a torre	7 g
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	7 g
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	7 g
Rimozione di manto di copertura in tegole	11 g
Demolizione di tetto a falde con orditura in legno	11 g
Demolizione generale di murature portanti eseguita con impiego di i	9 g
Demolizione di pareti divisorie	9 g
Rimozione di serramenti interni	4 g
Rimozione di pavimenti interni	7 g
Scavo a sezione ristretta	9 g
Realizzazione di micropali (tipo TUBFIX)	6 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	8 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	7 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	8 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	8 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	9 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	10 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbrica	11 g
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	12 g
Realizzazione di murature esterne	12 g
Realizzazione di divisori interni	17 g
Posa di manto di copertura in tegole	18 g
Realizzazione di opere di lattoneria	10 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inc	12 g
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali	8 g
Formazione intonaci interni (tradizionali)	29 g
Tinteggiatura di superfici interne	13 g
Tinteggiatura di superfici esterne	16 g
Posa di pavimenti su balconi e logge	7 g
Posa di rivestimenti esterni	17 g
Posa di serramenti esterni	12 g
Posa di serramenti interni	11 g
Posa di ringhiere e parapetti	5 g
Formazione di massetto per pavimenti interni	11 g
Posa di pavimenti per interni	29 g
Posa di rivestimenti interni	30 g
Realizzazione di impianto termico (autonomo)	52 g
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas	52 g
Realizzazione di impianto elettrico interno	52 g
Realizzazione di impianto ascensore	20 g
Smobilizzo del cantiere	4 g

LEGENDA Zona:
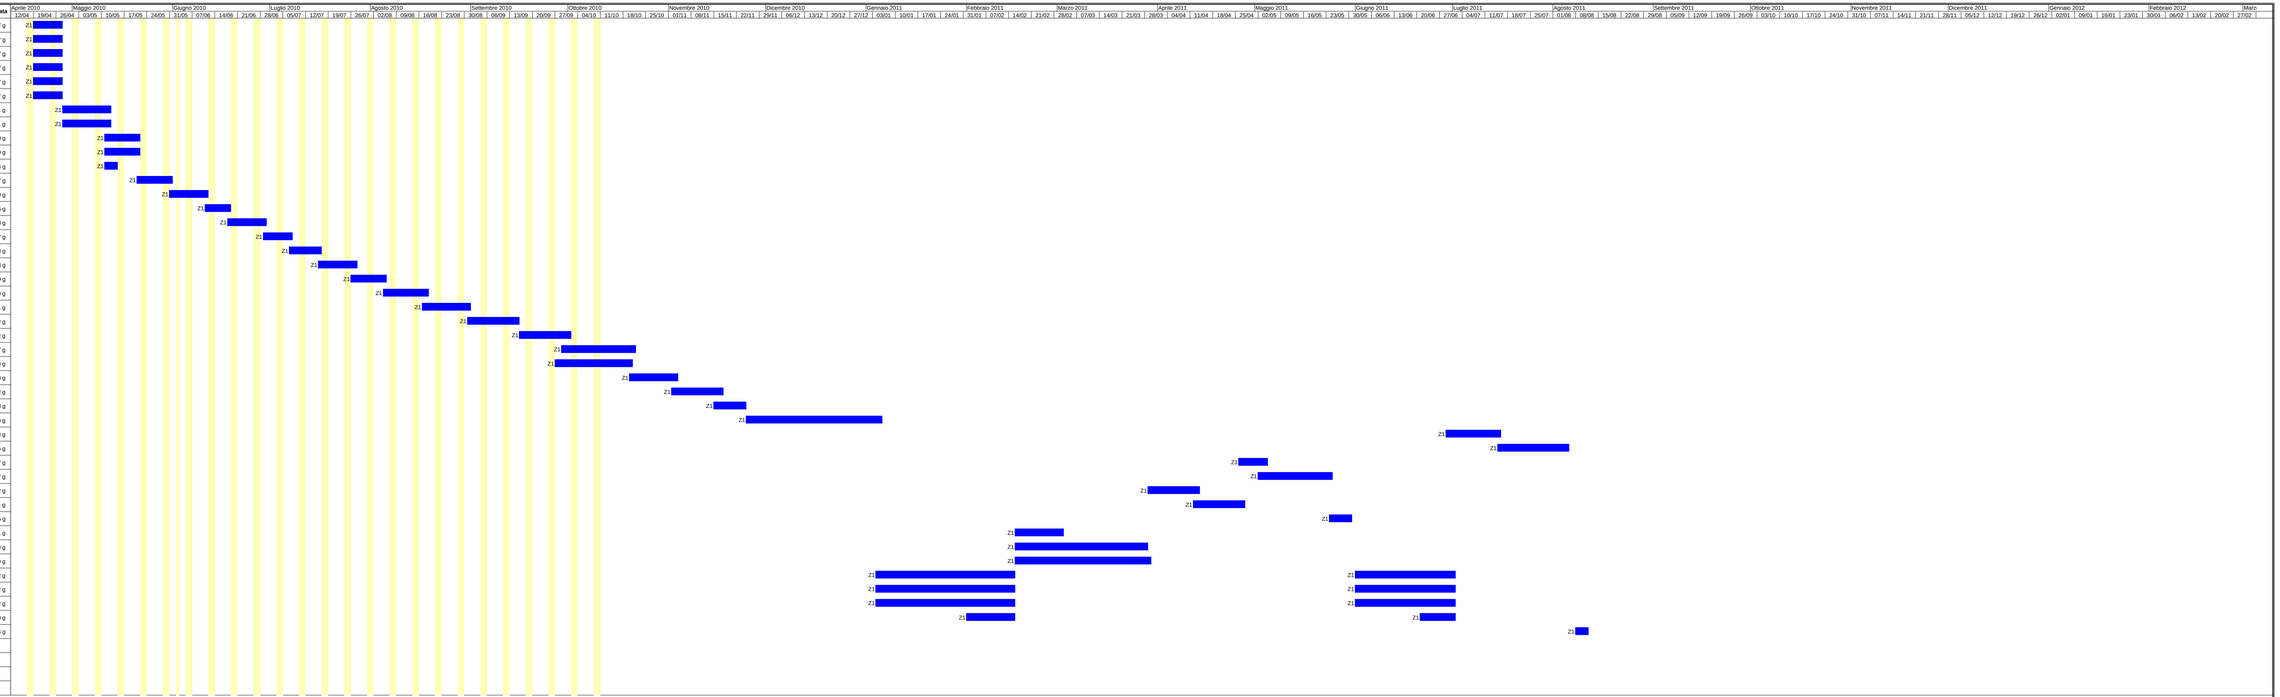
Z1 = ZONA UNICA
